

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

10 SQUARE F. COUPERIN

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	10 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LA80302	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	09/08/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 17/08/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Alain LEITE LOPES



C \ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	23
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	28
ATTESTATION(S)	30
CERTIFICAT DE COMPETENCES	31

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LA80302P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LA80302P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 13LA80302 09/08/2018

4/33

Version : 17/08/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LA80302P006	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

REÇU 06 AOÛT 2018

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 2770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 18468 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA	
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 2 Ensemble H000 Escaller A8 Étago 03 Logement 2 Module 13LA80302 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN ADRESSE 10 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN		

DÉLAI D'EXÉCUTION 2 JOURS **PÉRIODE DU** 26-07-2018 **AU** 27-07-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE I A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLS SOLS MURS Y COMPRIS FAIENCE SDB SALLE BAIN CONTACTER GARDIEN 08 88 40 92 27	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				97,00
T.V.A. 20,00 %				
TOTAL T.T.C.				582,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	13 2 H000 A8 13LA80302	L 9516	582,00	

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 18468

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Peinture			
Chambre 3	Béton				Dalle de sol	Peinture			
Gaine technique									
WC	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Peinture			
Séjour	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Débarras	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			

Rapport N° : 13LA80302 09/08/2018

8/33

Version : 17/08/2018

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle d'eau	Béton				Peinture	Peinture			
Salle d'eau	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Peinture			
Couloir	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	13LA80302P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie		Peinture	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	13LA80302P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	13LA80302P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras		Dalle de sol	Ragréage gris	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA80302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	13LA80302P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	13LA80302P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	13LA80302P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Peinture	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	13LA80302P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Ragréage gris	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Ragréage gris	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Ragréage gris	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Ragréage gris	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Ragréage gris	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Ragréage gris	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Ragréage gris	13LA80302P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	13LA80302P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	13LA80302P003	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	13LA80302P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	13LA80302P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	13LA80302P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	13LA80302P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	13LA80302P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LA80302P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA80302 09/08/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + papier non séparable + peinture non séparable	09/08/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LA80302P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA80302 09/08/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	09/08/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 13LA80302P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA80302 09/08/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	09/08/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LA80302P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA80302 09/08/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise hétérogène + carrelage	09/08/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

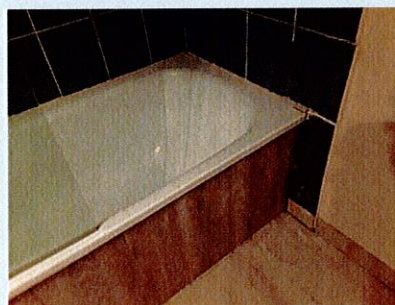

PRELEVEMENT : 13LA80302P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LA80302 09/08/2018		Buanderie
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	09/08/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

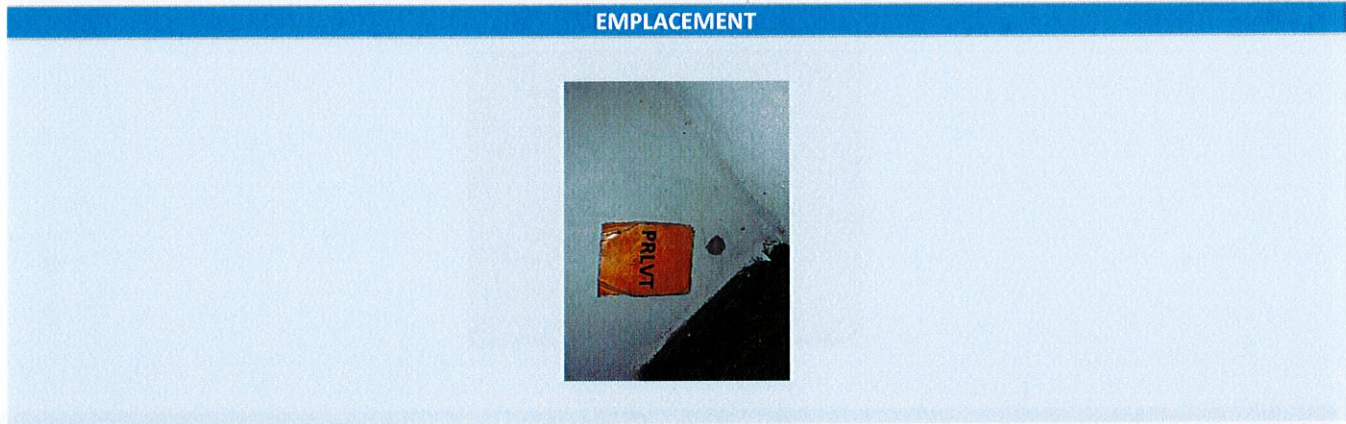

PRELEVEMENT : 13LA80302P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LA80302 09/08/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	09/08/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

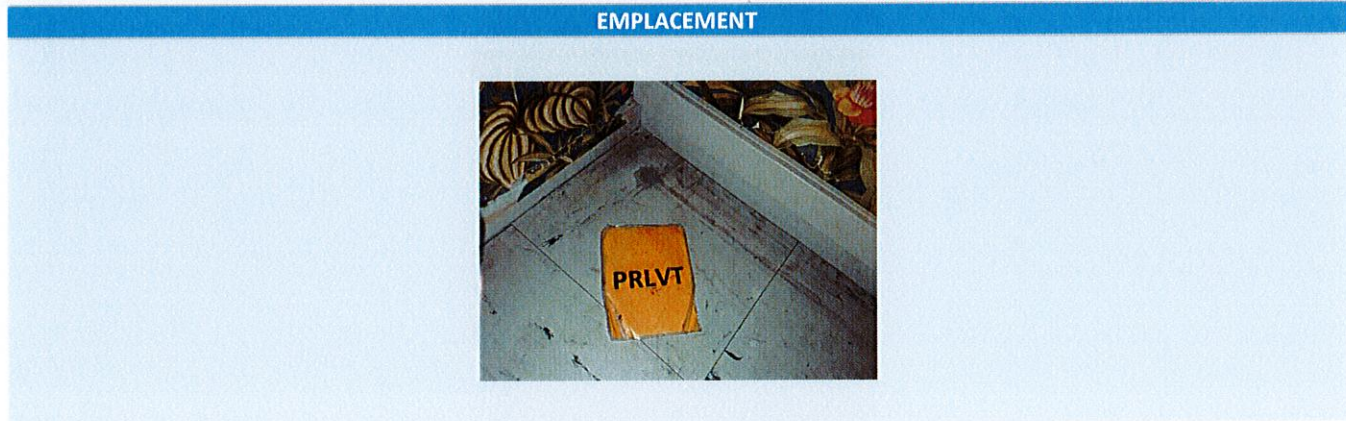

PRELEVEMENT : 13LA80302P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LA80302 09/08/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris	09/08/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA80302P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LA80302 09/08/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	09/08/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA80302P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LA80302 09/08/2018		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	09/08/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

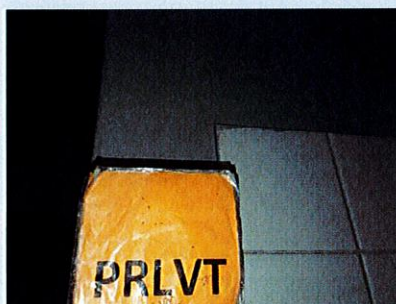

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-85160 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-85160 Ref. Commande Client : 13LA80302-01
--	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/08/2018


Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 13LA80302-01 - 10 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LA80302P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur F Béton	META	1	16/08/2018	Amiante non détecté /
Ref dossier client : 13LA80302-01 - 10 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LA80302P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Plafond Enduit Peinture béton	META	1	16/08/2018	Amiante non détecté / -



Validé par : Gwladys PATISSOU - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-85160 EN DATE DU 17/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 13LA80302-01 - 10 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LA80302P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit				Ref échantillon ITGA : IT071808-23871 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	16/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LA80302-01 - 10 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LA80302P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Carrelage				Ref échantillon ITGA : IT071808-23872 Description ITGA : Colle grise hétérogène / Carrelage
* Colle grise hétérogène + carrelage	META	1	16/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LA80302-01 - 10 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LA80302P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Buanderie Sol Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071808-23873 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture
* Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META	1	16/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LA80302-01 - 10 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LA80302P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Dalle de sol				Ref échantillon ITGA : IT071808-23874 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragraage gris
* Dalle dure cassante grise	META	1	17/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Ragraage gris	META	1	17/08/2018	Amiante non détecté / -
* Colle bitumineuse noire	MCLP	2	14/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 13LA80302-01 - 10 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN Ref échantillon client : 13LA80302P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur C Falence 1				Ref échantillon ITGA : IT071808-23875 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en papier / Peinture / Carrelage
* Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche en papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	META	1	16/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
 DTA 164-01 rev 03

Page 2/2

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENCOBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIFP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 DU 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRMMT)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES BUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AEREAUX LIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC PACTON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANFIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETIF - Articles L 230 2, IL R 230 L DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/03/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de bénéficier de l'obligation d'assurance en concurrence avec les professionnels de ces activités des dispositions de l'article R273-2 du Code de la Construction et de l'Habitat et le décret n° 2006-1111 du 3 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers pour l'évaluation des risques de dommages visés à l'article L271-4 du Code de la Construction et de l'Habitat. L'assureur est titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par la compagnie accréditée dans le domaine de la construction ou employeur des salariés ou être titulaire de permis de construire ou de permis de louer. L'assureur est titulaire d'une certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L334-1 du Code de la Construction et de l'Habitat.

A défaut la garantie n'est pas acquise. Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'appréciation des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, franchises, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 472 238 ORIAS : 13010227
Tél. : 05 56 30 95 75

LES MAIRES DU 2018

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEITE LOPES Alain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- | | |
|-----------------------------|--|
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

* Missions de repérage de matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments soumis aux obligations de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments soumis aux obligations de la liste B. Missions de repérage de matériaux et produits de la liste C. Les missions visées à l'article 13 de l'arrêté du 17/01/2018.

Année du 21 novembre 2006, modification des critères de certification des candidats en des personnes physiques et des candidats en des personnes physiques exerçant une activité professionnelle de diagnostiqueur immobilier. Le présent certificat est délivré aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle de diagnostiqueur immobilier. Le présent certificat est délivré aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle de diagnostiqueur immobilier. Le présent certificat est délivré aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle de diagnostiqueur immobilier.



Gage de fiabilité



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés

